

التقرير الأسبوعي	
رقم المشروع: ٢٣٠١	تاريخ التقرير: ٢٠٢٣/٣/٢٢
المالك: وليد الرادادي	رقم التقرير: ٢٣٠١-٦
المقاول: مسارات التطوير العقاري.	

م	المهام المنجزة	المرحلة
١	نجارة وحدادة الاعتاب الكبيرة.	التأسيس
٢	بدء تأسيس الكهرباء في الدور الثاني.	
٣	معالجة اماكن الزراجين والتعشيشات.	
٤	بناء غرفة المصعد وتعليق البناء فوق الكمره المقلوبه.	
٥	بدء التأسيس لتمديدات التكييف.	
٦	شد سقف غرفة المصعد.	
٧	اعمال مباني الملحق.	
٨	نظافة الدور الأول.	
٩	تأسيس اعمال التكييف والسباكة في الدور الثاني.	

م	المهام القادمة	المرحلة	التوقيت المتوقع
١	استكمال تأسيس وتمديدات الكهرباء والسباكة والتكييف، في الدور الثاني والملحق.	التأسيس	١٠ أيام عمل
٢	حديد وصب سقف غرفة المصعد.		
٣	استكمال نظافة الأدوار.		
٤	بدء التجهيز لأعمال اللياسة.		

0546686990



info@redp-sa.com




redp-sa.com



مكة المكرمة , النسيم



## المرفقات

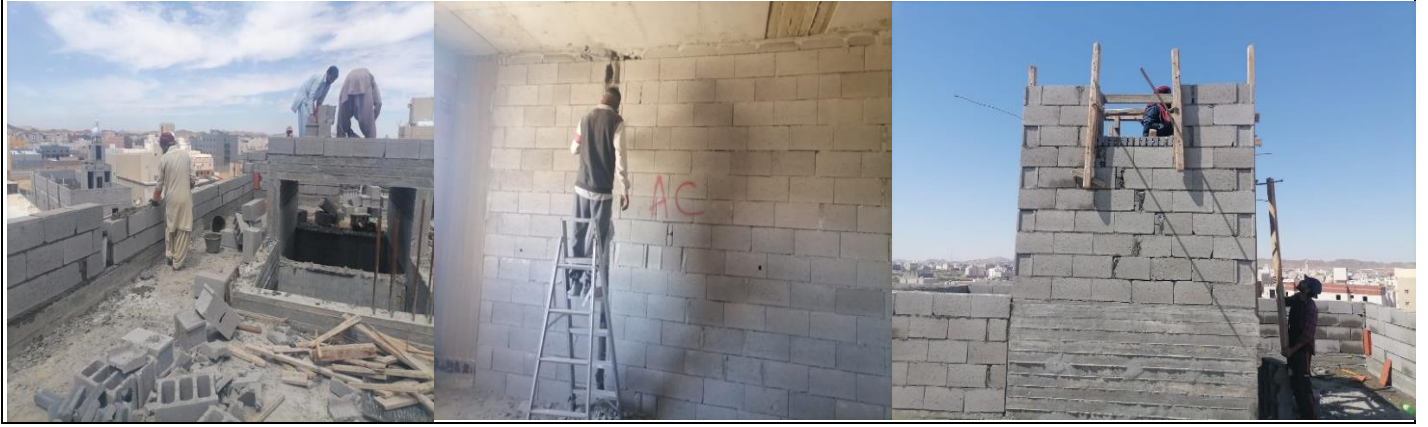

0546686990



info@redp-sa.com



redp-sa.com



مكة المكرمة , النسيم

